


**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП Д\_36x72**

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"	ЗАКАЗЧИК
Исполнитель: Сафиуллин Рамиль Гаптрашитович	Контактное лицо:
Тел.: 7(8552)59-59-00,+7-917-278-95-73	Тел.:
Email: tentmax@mail.ru	Email:

Форма каркаса	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
<b>Д</b>	<b>хоккей</b>	<b>холодный</b>	<b>тент/тент</b>	<b>Сталь 3сп (С235)</b>
Ширина, м	Длина, м	Высота по стене, м	Высота по коньку, м	Укрываемая, S м <sup>2</sup>
<b>36,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,60</b>	<b>2 592,00</b>

№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание
1	<b>Металлок аркас</b>	Сталь 3сп(С235)	<b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. <b>Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса</b> - холодное цинкование.
2	<b>Тентовое покрытие</b>	ПВХ ткань плотность 900 г/м2	<b>Армированная тентовая мембрана</b> - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур.
3	<b>Доп. оборудование</b>		Двери 2,1x0,9 - 3 шт. Вент. клапана с эл. приводом - 4 шт.

**СХЕМА АНГАРА тип Д**

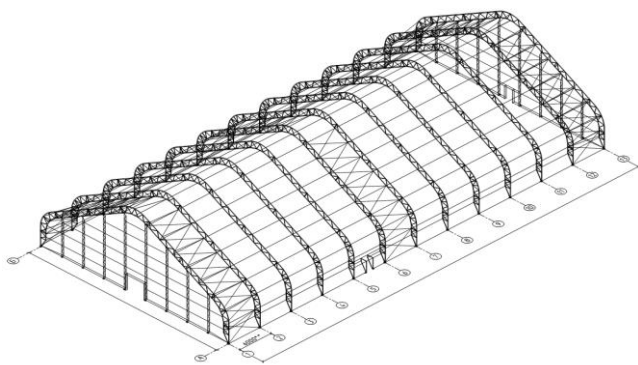


**Гарантированный срок эксплуатации 15 лет**

**Ангар рассчитан** на III снеговой и II ветровой район  
**Ангар монтируется** на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку.  
**Преимущества данного ангара:**  

- ✓Сжатые сроки реализации
- ✓Неоднократный монтаж/демонтаж
- ✓Облегченный фундамент
- ✓Светопропускаемость ткани ПВХ до 80%
- ✓Возможность нанесения фирменного логотипа

Сроки выполнения работ		Условия оплаты	
Изготовление ангара	<b>30 раб.дней</b>	1 платеж от стоим. дог-ра	<b>60% аванс</b>
Монтажные работы	<b>30 раб.дней</b>	2 платеж от стоим. дог-ра	<b>30% (гот. к отгрузке)</b>
Период действия КП	<b>15 кал.дней</b>	3 платеж от стоим. дог-ра	<b>10% после монтажа</b>
Наименование продукции / работ		Стоимость (с уч. НДС 18%), руб.	
Стоимость изготовления ангара		6 343 000,00	
Доставка		Зависит от пункта назначения	
Монтажные работы		По желанию заказчика	
<b>Общая стоимость договора</b>		<b>6 343 000,00</b>	

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

  
(подпись)
