


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП А 16x50

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"	ЗАКАЗЧИК
Исполнитель: Высоцкий Виктор	Контактное лицо:
Тел.: 7(8552)59-59-00; 8-917-261-74-43	Тел.:
Email: info@tentmax.ru	Email:

Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
А	телятник	холодный	тент/тент	Сталь 3сп (С235)
Ширина, м	Длина, м	Высота по стене, м	Высота по коньку, м	Укрываемая, S м ²
16,00	50,00		8,00	800,00

№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание
1	Металлок аркас	Сталь 3сп(С235)	Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование
2	Тентовое покрытие	ПВХ ткань плотность 900 г/м2	Крыша и Стены- Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур
3	Доп. оборудование		Торцевые распашные ворота размер 3x3 м. -6 шт.; коньковая вент.щель; боковые подъемные фартуки.

СХЕМА АНГАРА тип А

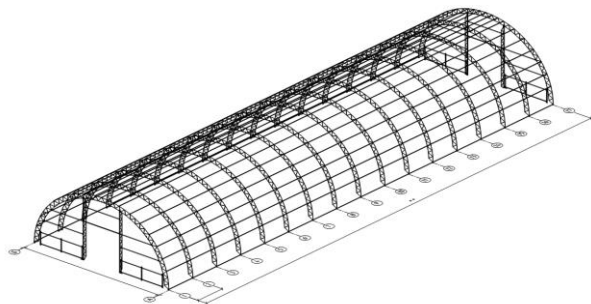

Ангар монтируется на подготовленное фундаментное основание. заказчиком. Техническое задание на фундамент разрабатывается компанией ТЕНТПРОЕКТ и предоставляется после заключения договора на поставку. Для монтажа требуется подъемная техника: автокран, автовышка.

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

Сроки выполнения работ		Условия оплаты	
Изготовление ангара	15 раб.дней	1 платеж от стоим. дог-ра	60% аванс
Монтажные работы	15 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	30% (гот. к отгрузке)
Период действия КП	15 кал.дней	3 платеж от стоим. дог-ра	10% после монтажа

Наименование продукции / работ	Стоимость (с уч. НДС 18%), руб.
Стоимость изготовления ангара	1 760 000,00
Доставка	Зависит от пункта назначения
Монтажные работы	По желанию заказчика
Общая стоимость договора	1 760 000,00

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

(подпись)
