


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП Д 36x72

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ" | ЗАКАЗЧИК |
|---|------------------|
| Исполнитель: Сафиуллин Рамиль Гаптрашитович | Контактное лицо: |
| Тел.: 7(8552)59-59-00,+7-917-278-95-73 | Тел.: |
| Email: tentmax@mail.ru | Email: |

| Тип ангара | Назначение | Исполнение | Покрытие крыши/стен | Материал каркаса |
|--------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Д | хоккей | холодный | тент/тент | Сталь 3сп (С235) |
| Ширина, м | Длина, м | Высота по стене, м | Высота по коньку, м | Укрываемая, S м ² |
| 36,00 | 72,00 | 3,00 | 14,60 | 2 592,00 |

| № | Наим-ние | Тех.хар. | Техническое описание |
|---|--------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Металлок аркас | Сталь 3сп(С235) | Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование |
| 2 | Тентовое покрытие | ПВХ ткань плотность 900 г/м2 | Крыша и Стены- Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур |
| 3 | Доп. оборудование | | Двери 2,1x0,9 - 3 шт. Вент. клапана с эл. приводом - 4 шт. Распашные ворота размер 3x3 м. (с дверью) - 1 шт.; |

СХЕМА АНГАРА тип Д

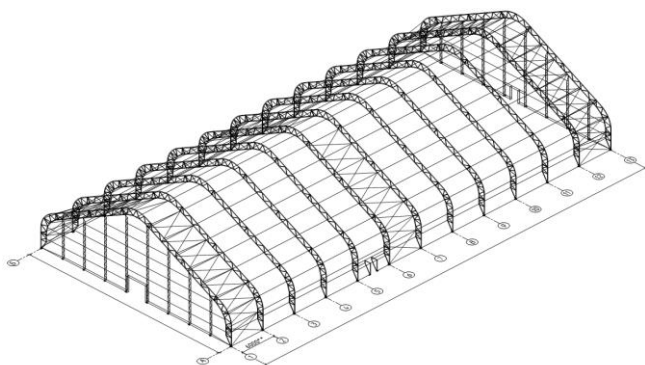

Ангар монтируется на подготовленное фундаментное основание. заказчиком. Техническое задание на фундамент разрабатывается компанией ТЕНТПРОЕКТ и предоставляется после заключения договора на поставку. Для монтажа требуется подъемная техника: автокран, автовышка.

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

| Сроки выполнения работ | | Условия оплаты | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Изготовление ангара | 20 раб.дней | 1 платеж от стоим. дог-ра | 60% аванс |
| Монтажные работы | 30 раб.дней | 2 платеж от стоим. дог-ра | 30% (гот. к отгрузке) |
| Период действия КП | 15 кал.дней | 3 платеж от стоим. дог-ра | 10% после монтажа |
| Наименование продукции / работ | | Стоимость (с уч. НДС 18%), руб. | |
| Стоимость изготовления ангара | | 6 310 000,00 | |
| Доставка | | Зависит от пункта назначения | |
| Монтажные работы | | По желанию заказчика | |
| Общая стоимость договора | | 6 310 000,00 | |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

(подпись)
