


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП В 24x48

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"	ЗАКАЗЧИК
Исполнитель: Петренко Фёдор	Контактное лицо:
Тел.: 8 937-572-24-05	Тел.:
Email: info@tentmax.ru	Email:

Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
В	склад	холодный	тент/тент	Сталь 3сп (С235)
Ширина, м	Длина, м	Высота по стене, м	Высота по коньку, м	Укрываемая, S м ²
20,00	50,00	4,60	9,30	1 000,00

№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание
1	Металлок аркас	Сталь 3сп(С235)	Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование
2	Тентовое покрытие	ПВХ ткань плотность 900 г/м2	Крыша и Стены- Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур
3	Доп. оборудование		Торцевые распашные ворота размер 4x4,5 м.с дверью - 1 шт.; Вент. клапана - 4 шт.

СХЕМА АНГАРА тип В

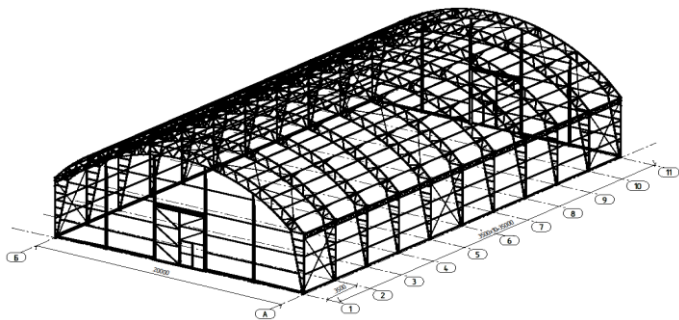

Ангар монтируется на подготовленное фундаментное основание. заказчиком. Техническое задание на фундамент разрабатывается компанией ТЕНТПРОЕКТ и предоставляется после заключения договора на поставку. Для монтажа требуется подъемная техника: автокран, автовышка.

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

Сроки выполнения работ		Условия оплаты	
Изготовление ангара	изготовлен	1 платеж от стоим. дог-ра	70% аванс
Монтажные работы	20 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	25% (гот. к отгрузке)
Период действия КП	15 кал.дней	3 платеж от стоим. дог-ра	5% после монтажа
Наименование продукции / работ		Стоимость (с уч. НДС 18%), руб.	
Стоимость изготовления ангара		2 600 000,00	
Доставка		Зависит от пункта назначения	
Монтажные работы		По желанию заказчика	
Общая стоимость договора		2 600 000,00	

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

(подпись)
